



Quercusoft

Tutorial: Nivel de totalización

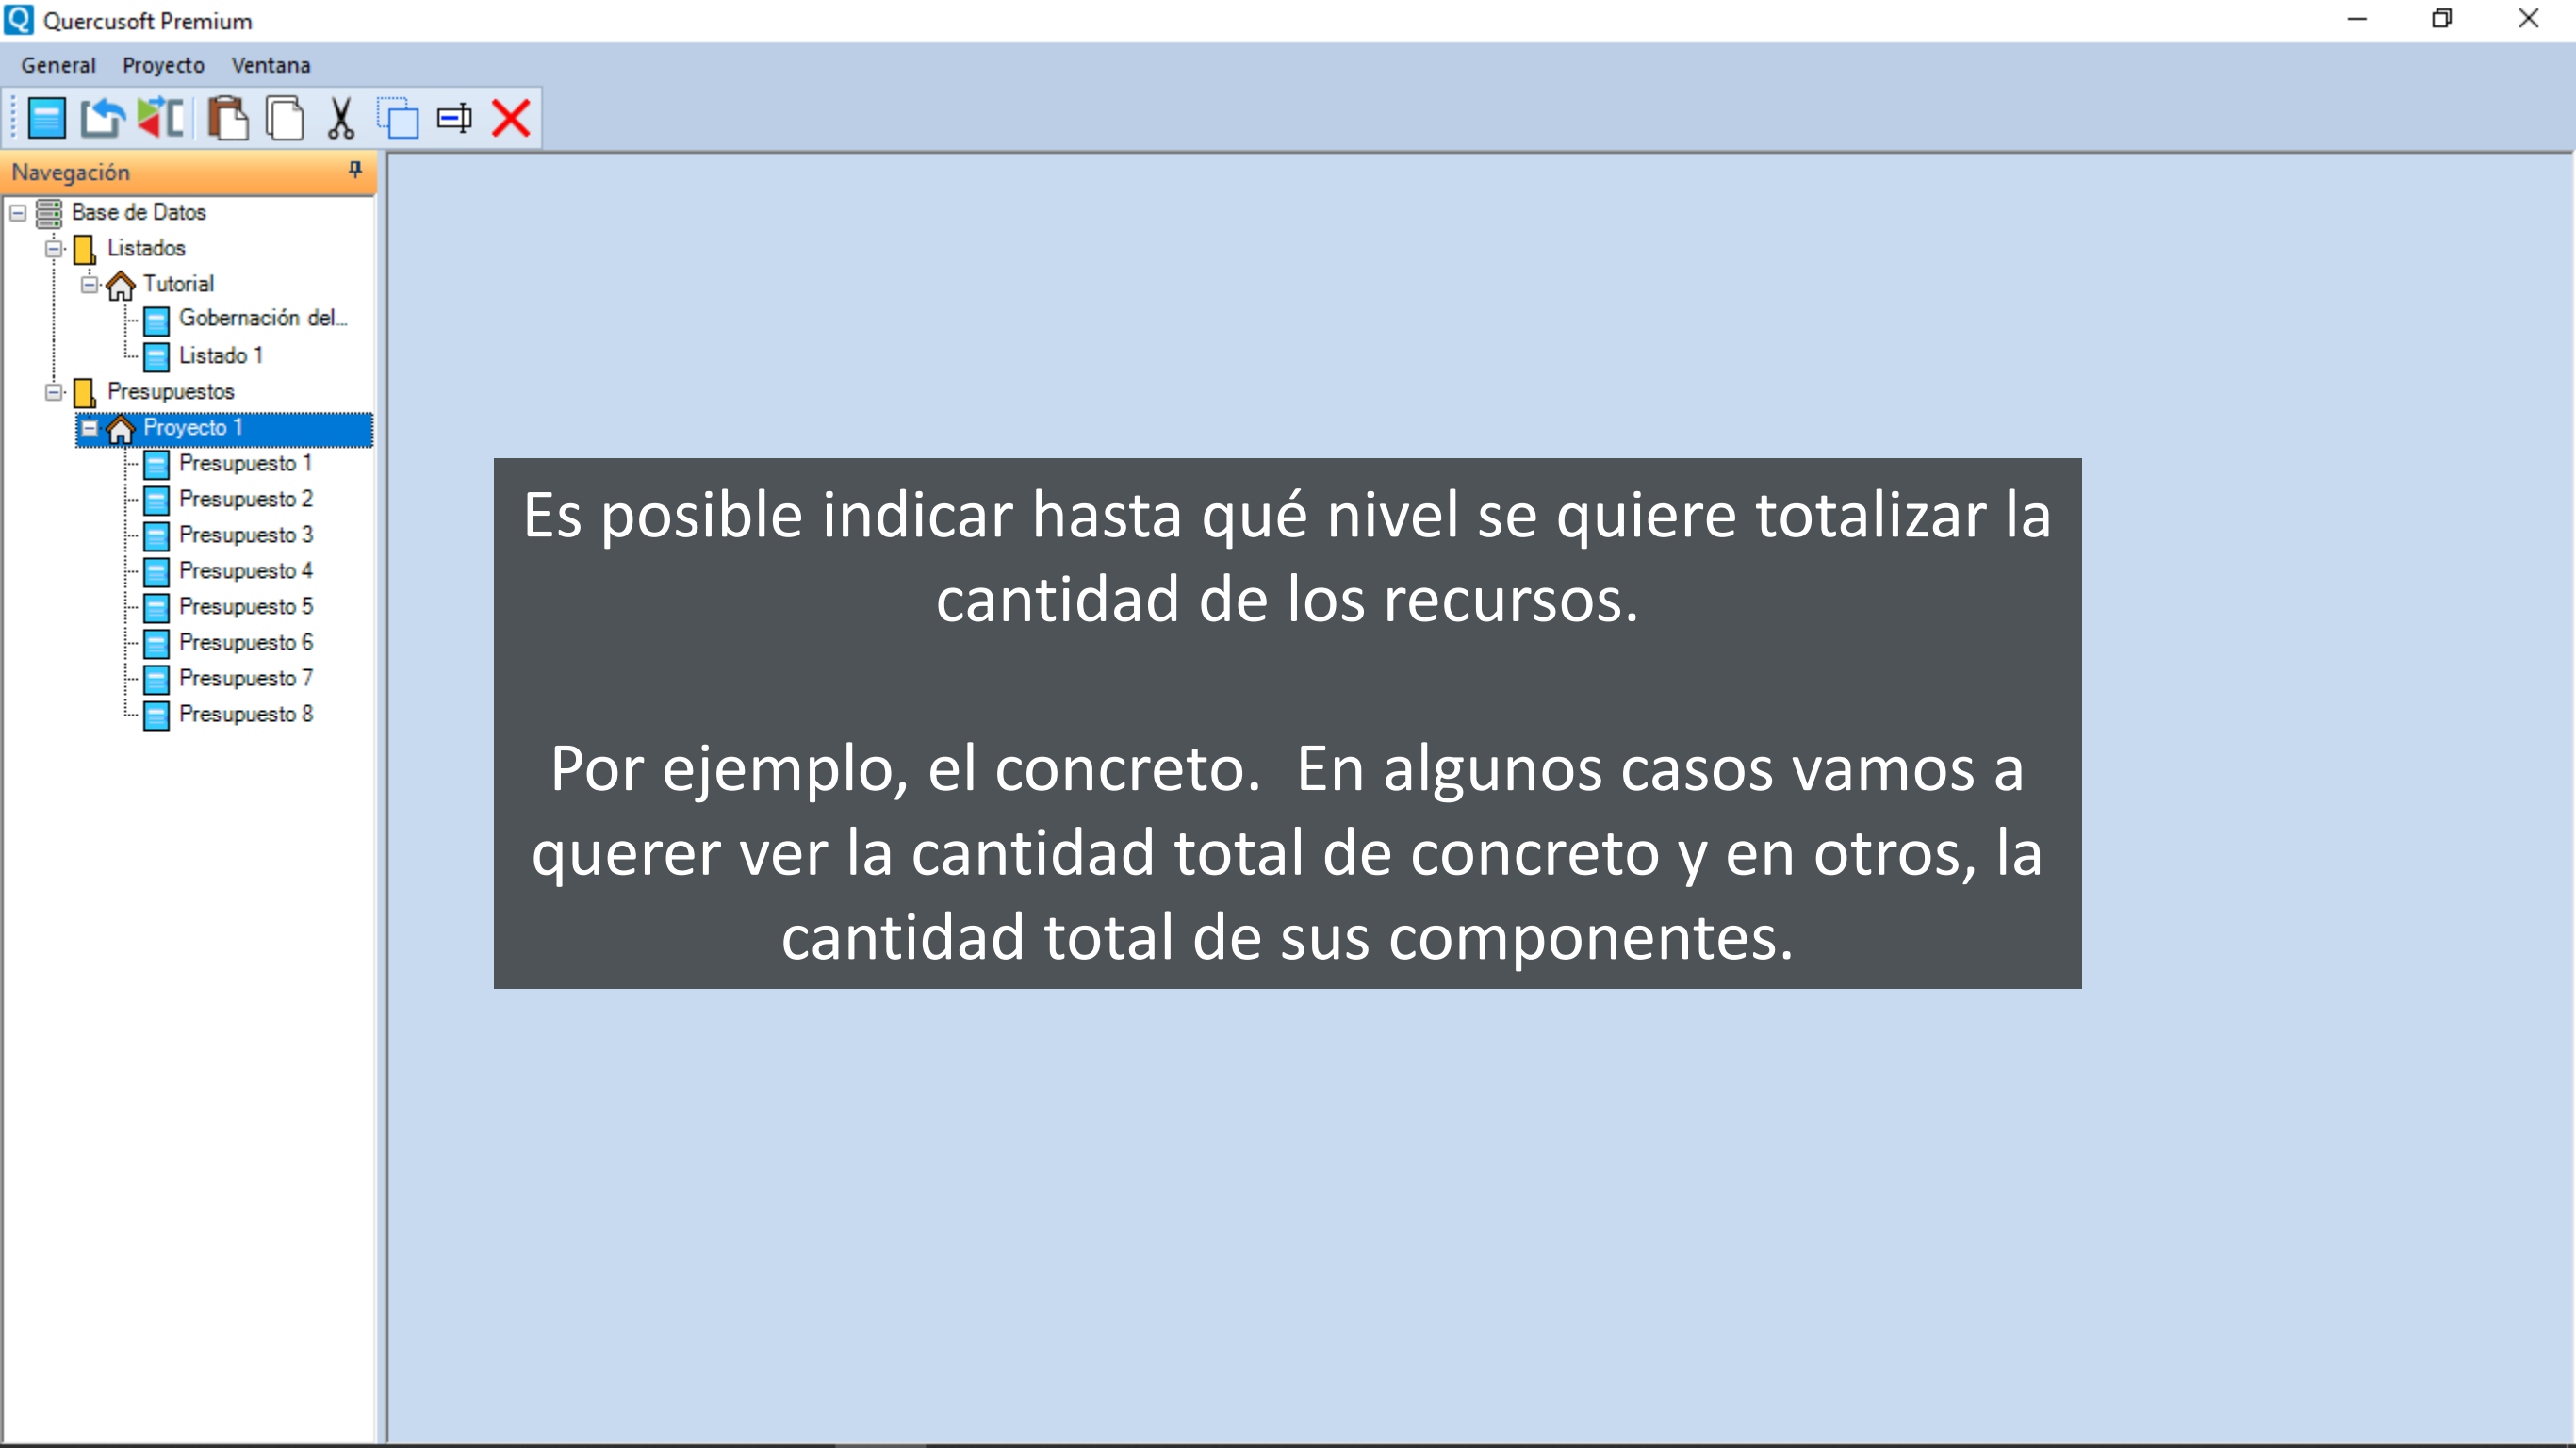


Es posible indicar hasta qué nivel se quiere totalizar la cantidad de los recursos.


Por ejemplo, el concreto. En algunos casos vamos a querer ver la cantidad total de concreto y en otros, la cantidad total de sus componentes.

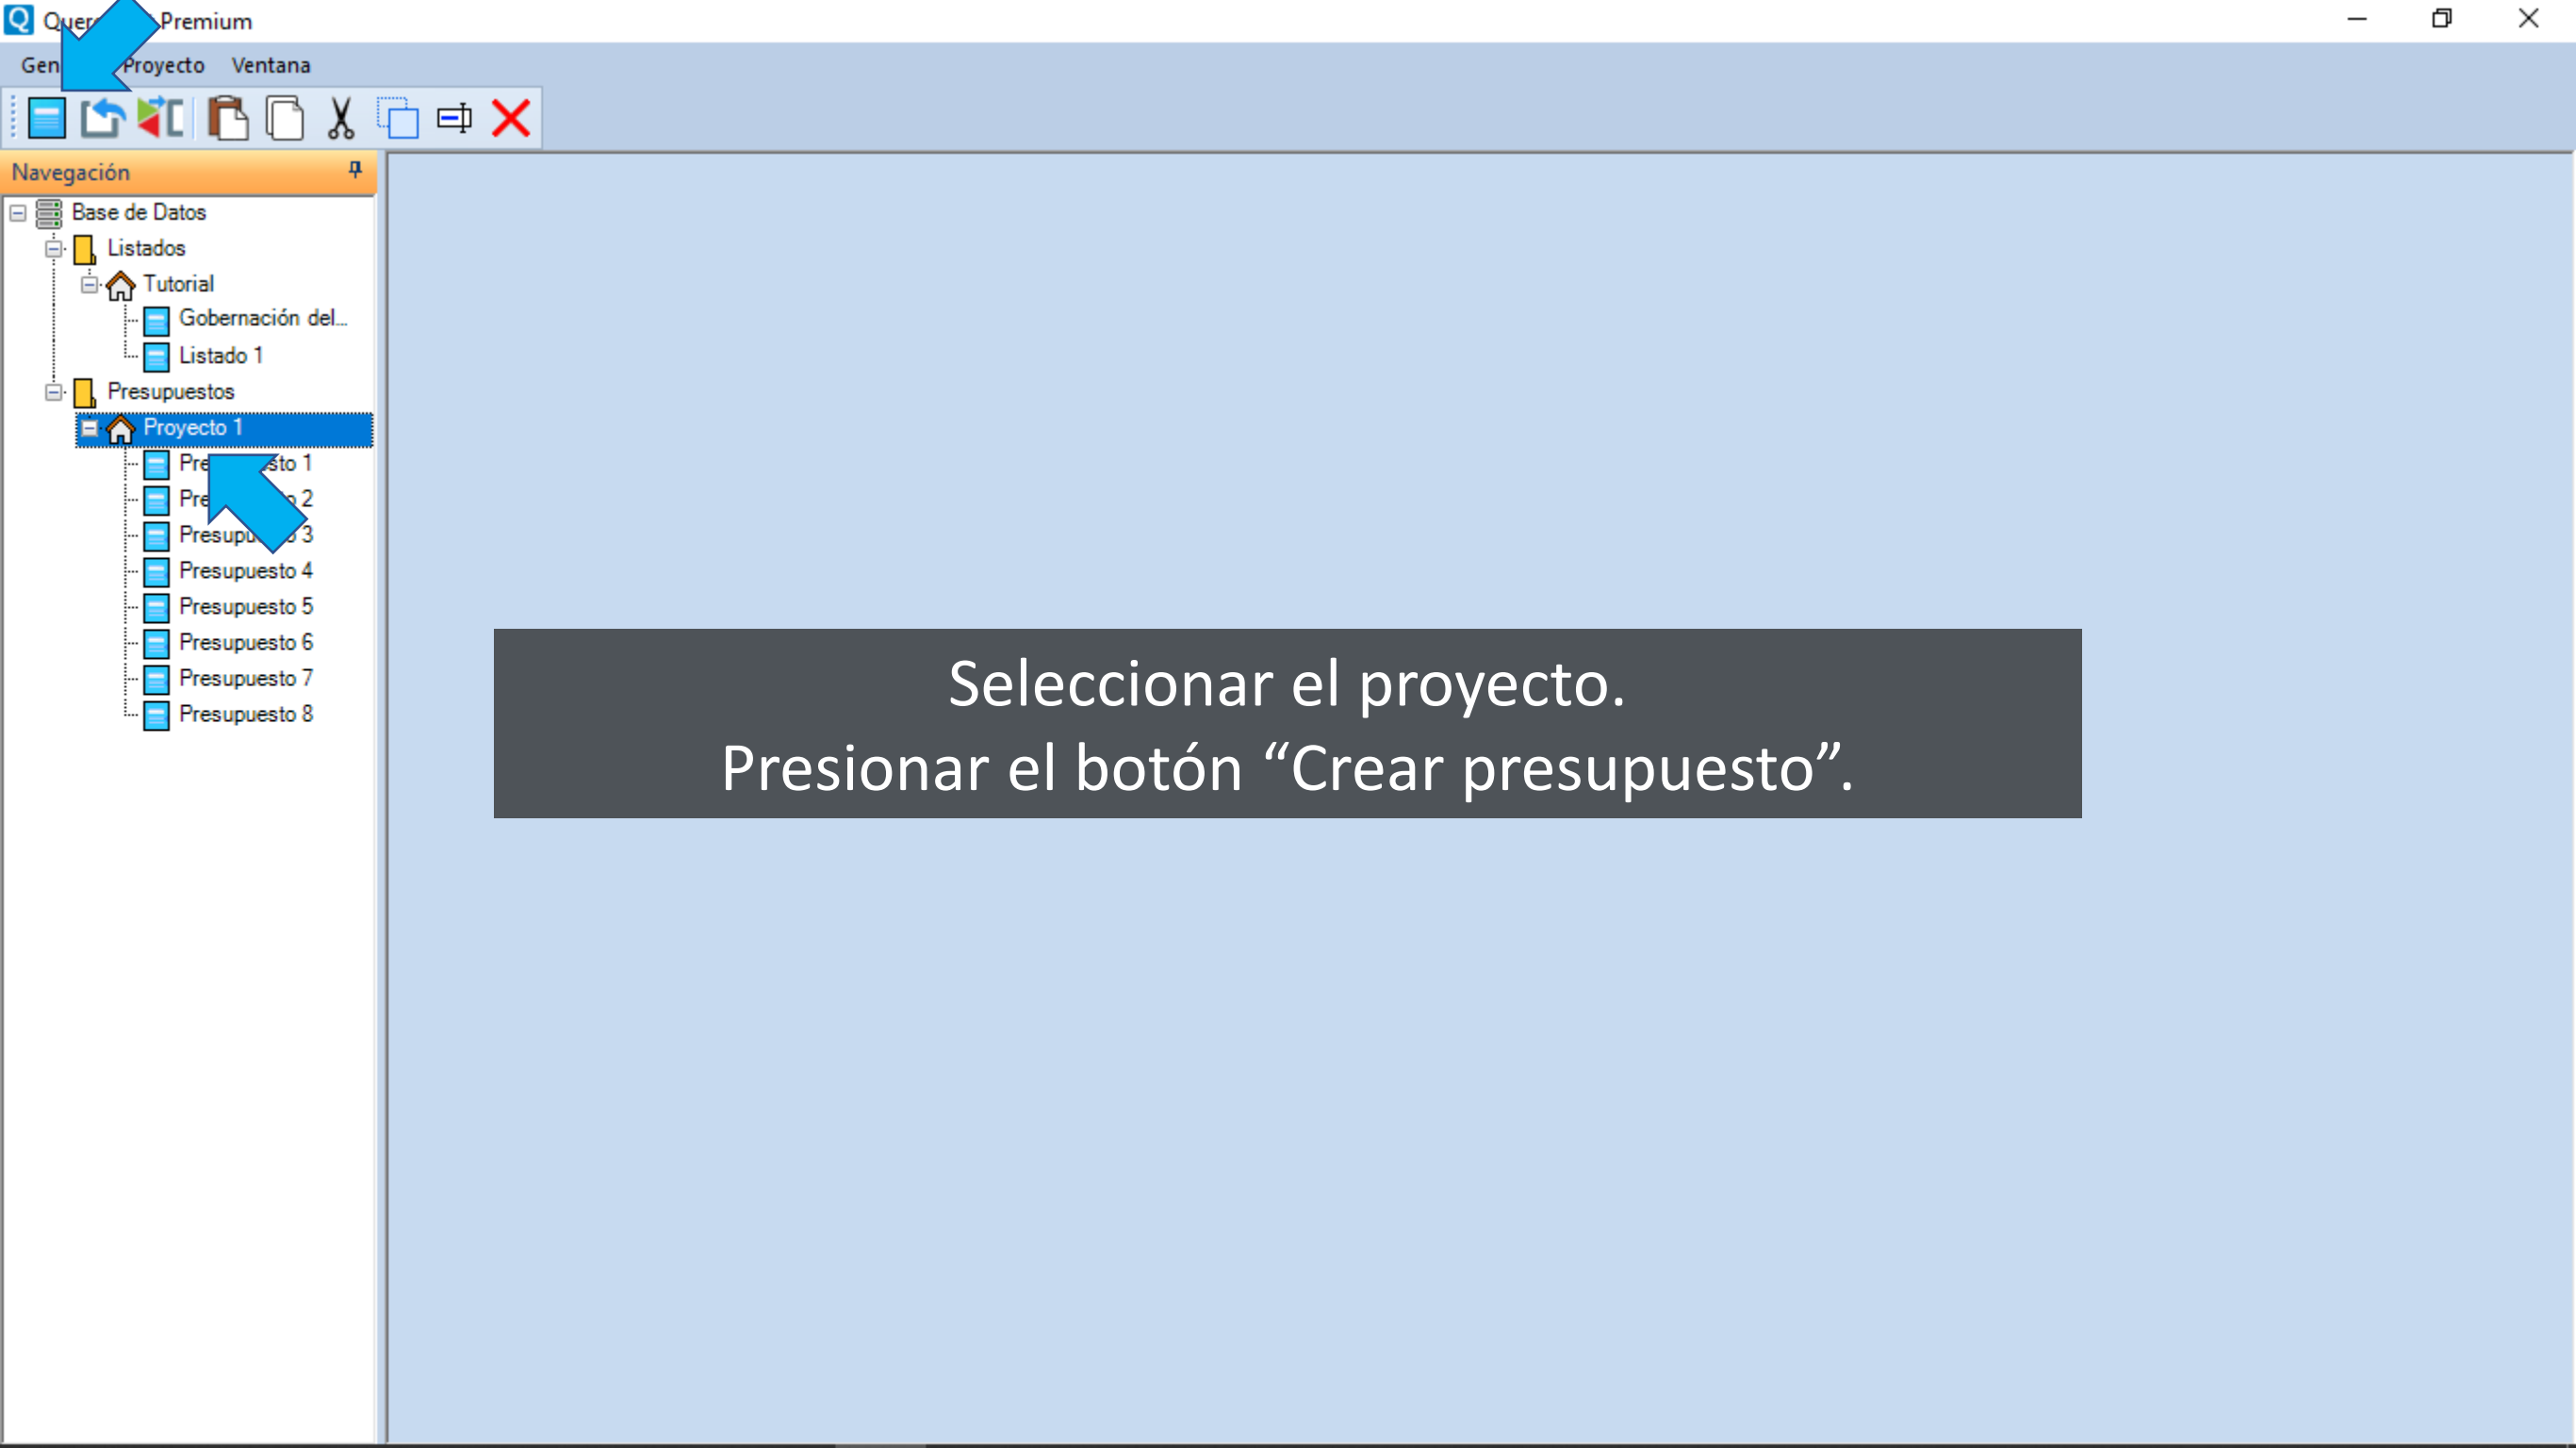

Seleccionar el proyecto.
Presionar el botón “Crear presupuesto”.

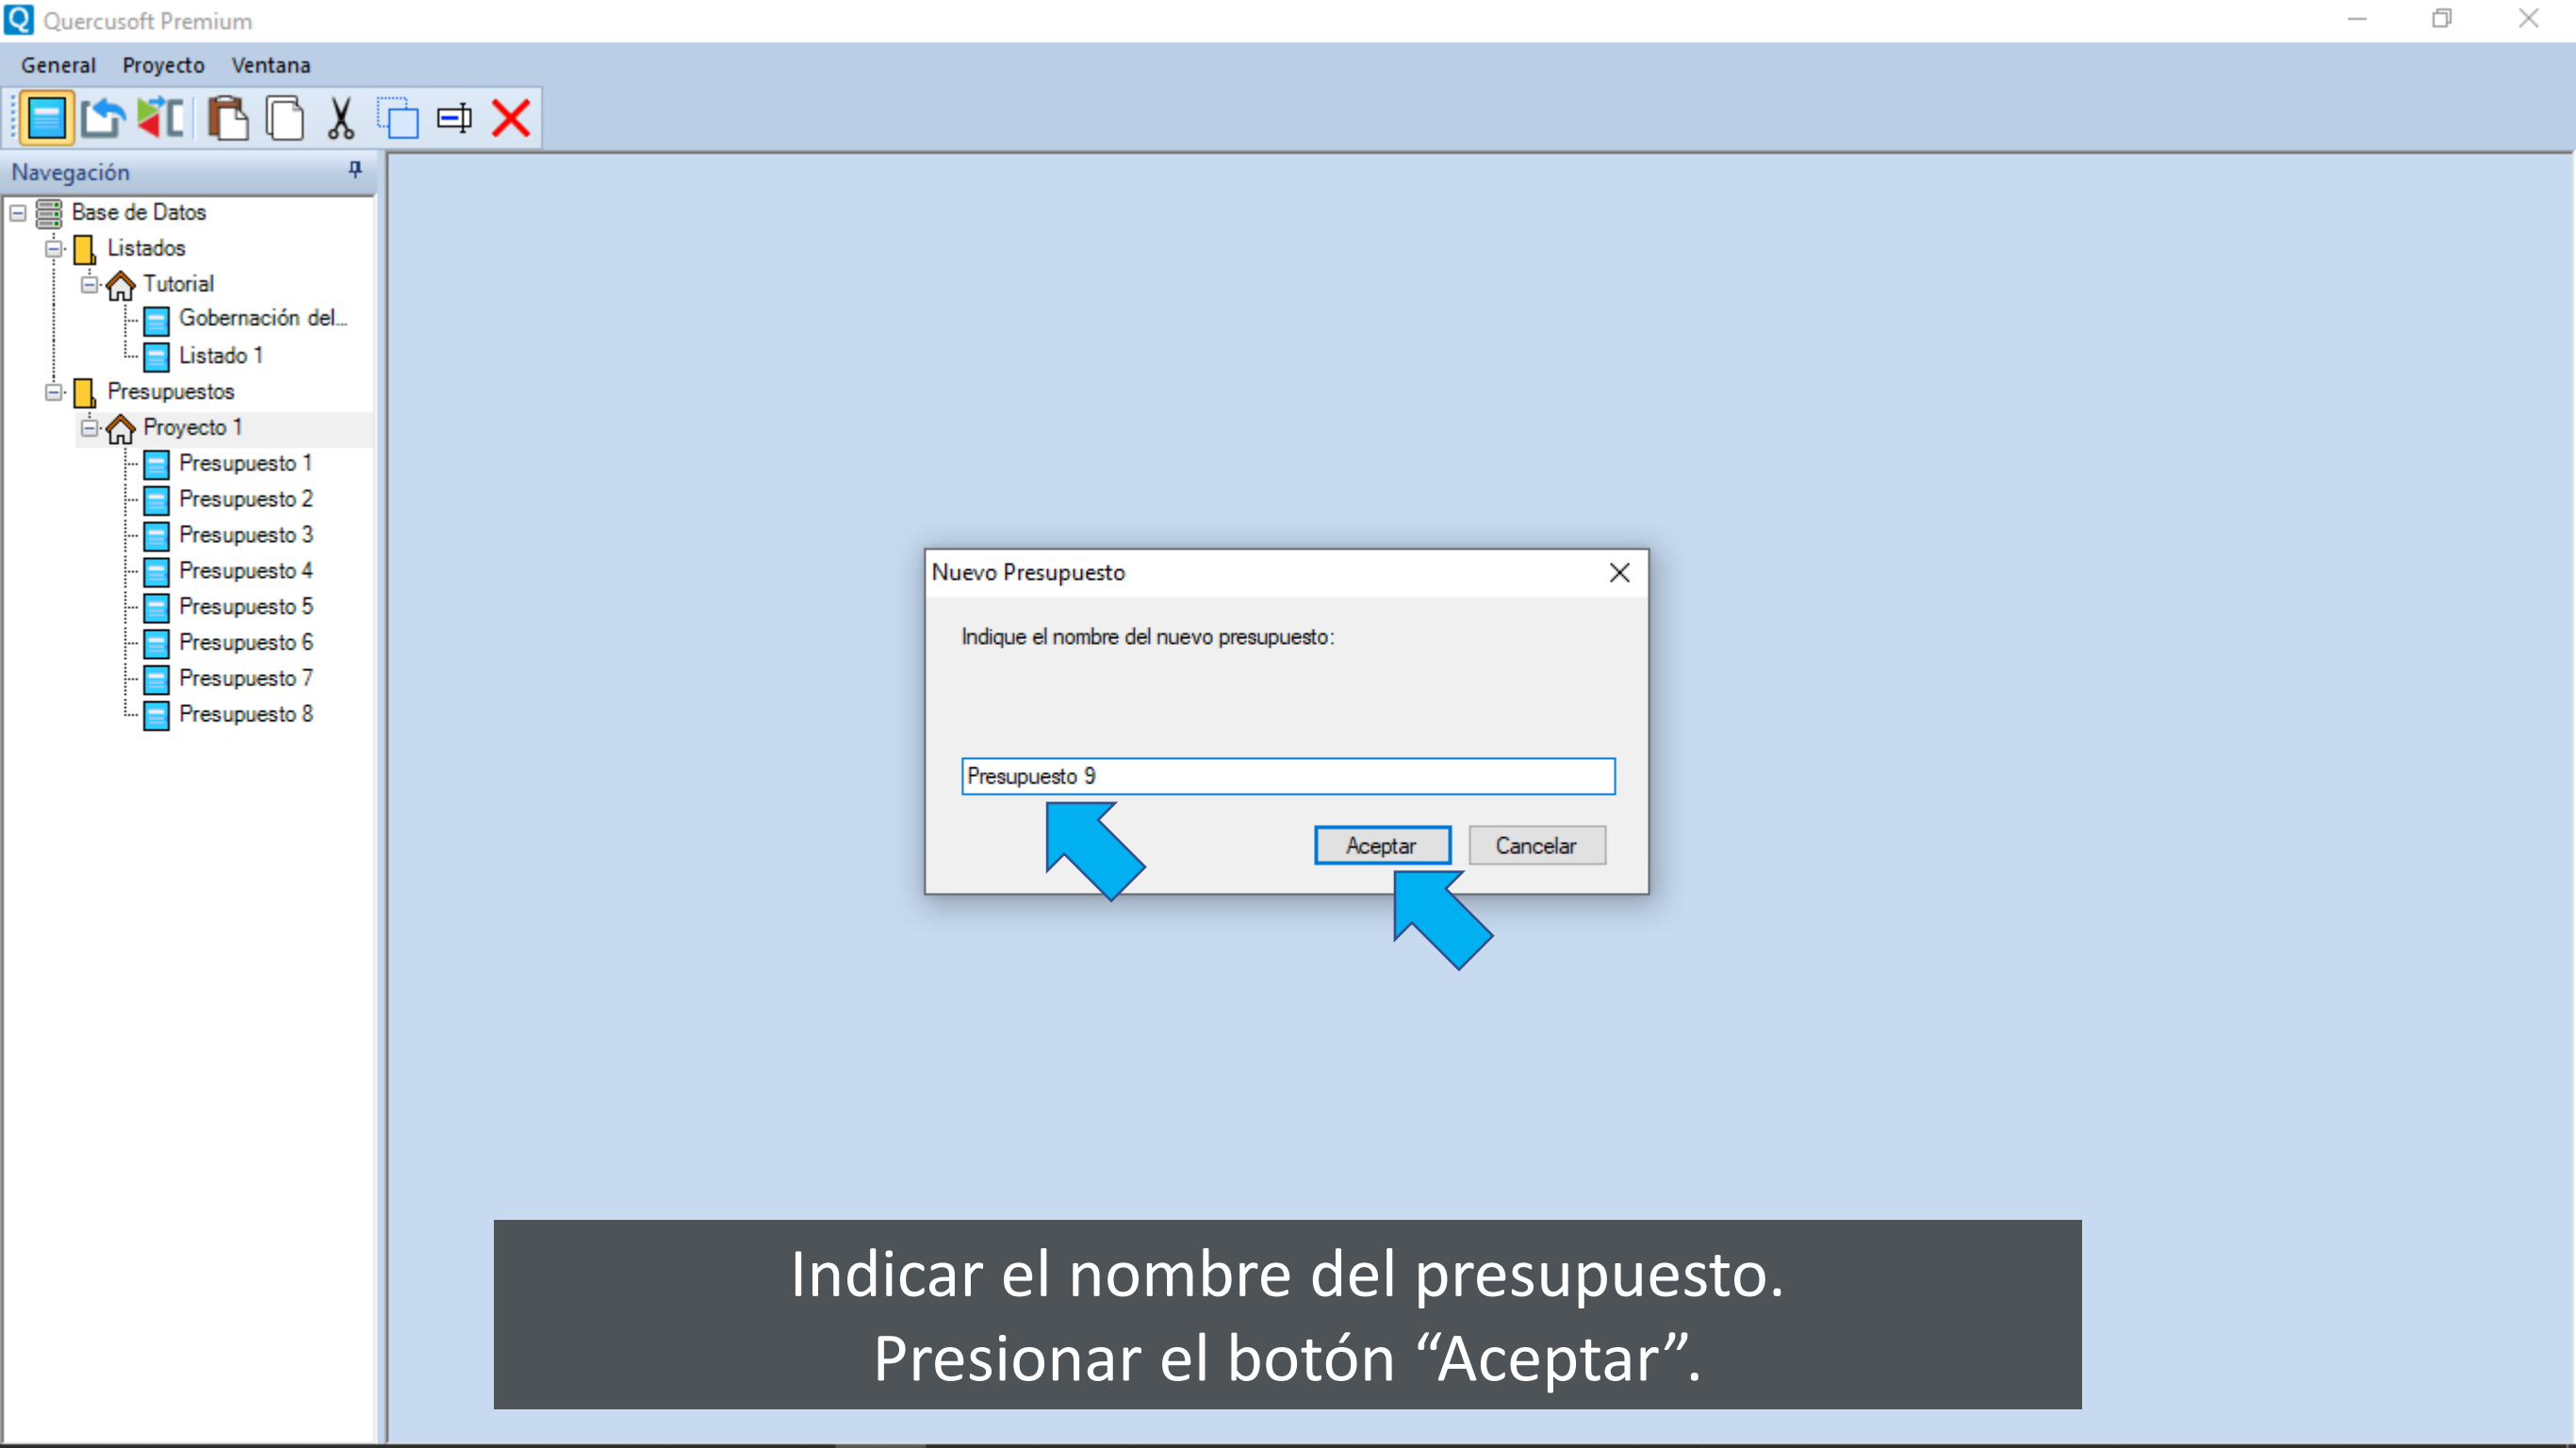

Indicar el nombre del presupuesto.
Presionar el botón “Aceptar”.

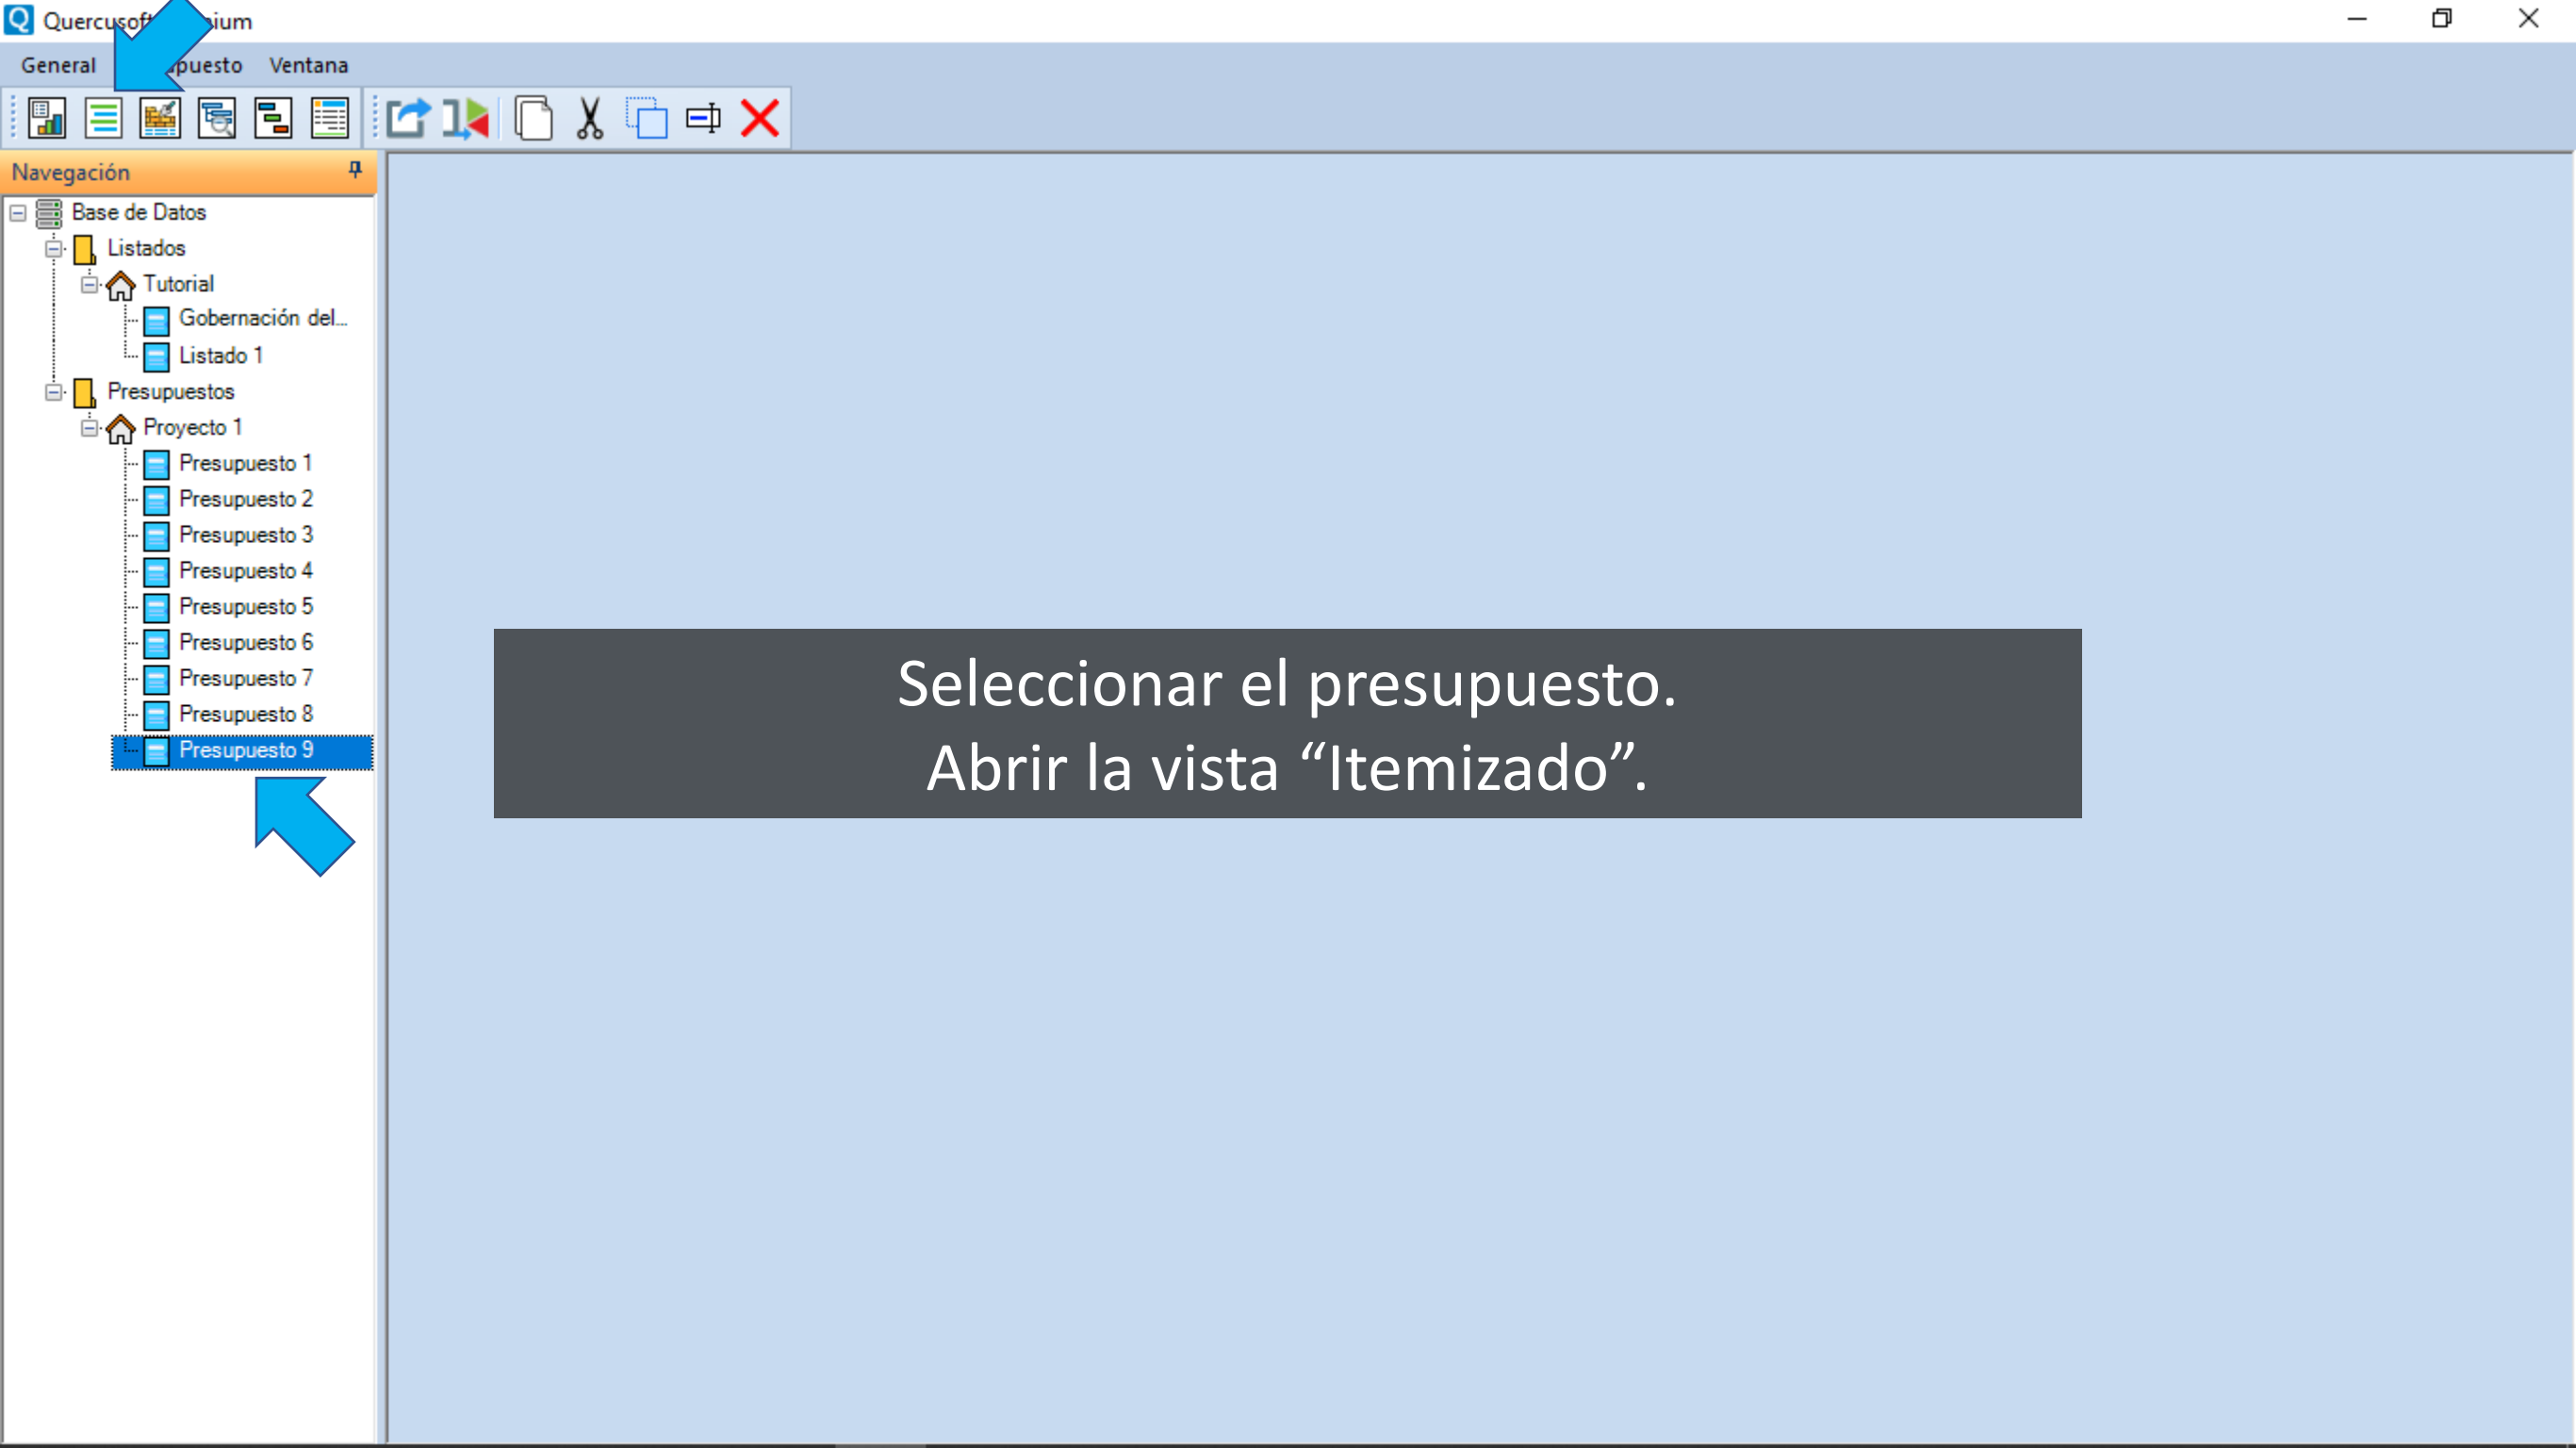

Seleccionar el presupuesto.
Abrir la vista "Itemizado".

 Presupuesto 9 [Itemizado]

◀ ▶



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
▶ 01	TAREA 1	M3	100.00	1.00		



Ingresar los datos de “TAREA 1”.



Árbol Superiores



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1	M3	100.00	1.00		


Ingresar los datos de “CONCRETO 2000 PSI”.

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código 01	Descripción TAREA 1	Unidad M3	P.U.	Cantidad 100.00	Factor 1.00	Cantidad Total 100	Importe	% Incidencia
	Material	MA01	CONCRETO 2000 PSI	M3		0.50	1.00	0.50		





Navegación



Presupuesto 9 [Itemizado]



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1	M3	100.00	1.00		

Visualizar el análisis de “CONCRETO 2000 PSI”
haciendo doble clic en el encabezado de la fila o
presionando el botón “Ver análisis”.

Análisis: 01 | TAREA 1

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código 01	Descripción TAREA 1	Unidad M3	P.U.	Cantidad 100.00	Factor 1.00	Cantidad Total 100	Importe	% Incidencia
	Material	MA01	CONCRETO 2000 PSI	M3		0.50	1.00	0.50		

Arbol Superiores



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1	M3	100.00	1.00	158,662.02	15,866,201.51

Ingresar el análisis de “CONCRETO 2000 PSI”.

Info	Tipo de Recurso	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad	Factor	Cantidad Total	Importe	% Incidencia
	Material	MA01	CONCRETO 2000 PSI	M3	317,324.03	0.50	1.00	0.5	158,662.02	100.00 %
	Equipo	EQ01	MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	79,422.00	1.00	/8.00	0.13	9,927.75	3.13 %
	Material	MA02	AGUA	LT	54.00	198.00	1.00	198.00	10,692.00	3.37 %
	Material	MA03	ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	56,537.00	0.63	1.00	0.63	35,618.31	11.22 %
	Material	MA04	CEMENTO GRIS	KG	642.00	260.00	1.00	260.00	166,920.00	52.60 %
	Material	MA05	TRITURADO EN MUNICIPIO	M3	53,845.00	0.84	1.00	0.84	45,229.80	14.25 %
	Mano de Obra	MO01	AYUDANTE	JORNAL	115,000.00	2.00	4.70	0.43	48,936.17	15.42 %

Navegación

- Tablero
- Itemizado
- Recursos
- Explorador
- Plan de trabajo
- Informes
- Exportar presupuesto
- Exportar FIEBDC

Proyecto 1

- Presupuesto 1
- Presupuesto 2
- Presupuesto 3
- Presupuesto 4
- Presupuesto 5
- Presupuesto 6
- Presupuesto 7
- Presupuesto 8
- Presupuesto 9



Presupuesto 9 [Itemizado]

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1	M3	100.00	1.00	158,662.02	15,866,201.51

Abrir la vista “Recursos” seleccionando en el menú “Presupuesto” y luego “Recursos”.

Análisis: 01 | TAREA 1

Info	Tipo de Recurso	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad	Factor	Cantidad Total	Importe	% Incidencia
	Material	MA01	CONCRETO 2000 PSI	M3	317,324.03	0.50	1.00	0.5	158,662.02	100.00 %
	Equipo	EQ01	MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	79,422.00	1.00	/8.00	0.13	9,927.75	3.13 %
	Material	MA02	AGUA	LT	54.00	198.00	1.00	198.00	10,692.00	3.37 %
	Material	MA03	ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	56,537.00	0.63	1.00	0.63	35,618.31	11.22 %
	Material	MA04	CEMENTO GRIS	KG	642.00	260.00	1.00	260.00	166,920.00	52.60 %
	Material	MA05	TRITURADO EN MUNICIPIO	M3	53,845.00	0.84	1.00	0.84	45,229.80	14.25 %
	Mano de Obra	MO01	AYUDANTE	JORNAL	115,000.00	2.00	/4.70	0.43	48,936.17	15.42 %

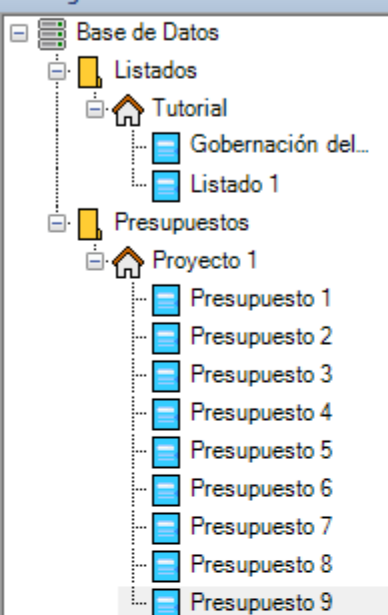



Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 15,866,201.51	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					2,446,808.51		15.42 %
MO01	AYUDANTE	JORNAL	115,000.00	21.28	2,446,808.51	100.00 %	15.42 %
Equipos					496,387.50		3.13 %
EQ01	MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	79,422.00	6.25	496,387.50	100.00 %	3.13 %
Materiales					12,923,005.50		81.45 %
MA02	AGUA	LT	54.00	9,900.00	534,600.00	4.14 %	3.37 %
MA03	ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	56,537.00	31.50	1,780,915.50	13.78 %	11.22 %
MA04	CEMENTO GRIS	KG	642.00	13,000.00	8,346,000.00	64.58 %	52.60 %
MA05	TRITURADO EN MUNICIPIO	M3	53,845.00	42.00	2,261,490.00	17.50 %	14.25 %



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
--------	-------------	--------	----------	--------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------



En la vista “Recursos” se muestran los componentes de “CONCRETO 2000 PSI”.



Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 15,866,201.51	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					2,446,808.51		15.42 %
MO01	AYUDANTE	JORNAL	115,000.00	21.28	2,446,808.51	100.00 %	15.42 %
Equipos					496,387.50		3.13 %
EQ01	MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	79,422.00	6.25	496,387.50	100.00 %	3.13 %
Materiales					12,923,005.50		81.45 %
MA02	AGUA	LT	54.00	9,900.00	534,600.00	4.14 %	3.37 %
MA03	ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	56,537.00	31.50	1,780,915.50	13.78 %	11.22 %
MA04	CEMENTO GRIS	KG	642.00	13,000.00	8,346,000.00	64.58 %	52.60 %
MA05	TRITURADO EN MUNICIPIO	M3	53,845.00	42.00	2,261,490.00	17.50 %	14.25 %

Cambiar a la vista “Itemizado” seleccionando la solapa correspondiente.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
--------	-------------	--------	----------	--------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------




Presupuesto 9 [Itemizado] Presupuesto 9 [Recursos]

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1	M3	100.00	1.00	158,662.02	15,866,201.51

Hacer clic en el panel “Análisis”.
Presionar el botón “Ver superior”.

Análisis: 01 | TAREA 1

Info	Tipo de Recurso	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad	Factor	Cantidad Total	Importe	% Incidencia
	Material	MA01	CONCRETO 2000 PSI	M3	317,324.03	0.50	1.00	0.5	158,662.02	100.00 %
	Equipo	EQ01	MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	79,422.00	1.00	/8.00	0.13	9,927.75	3.13 %
	Material	MA02	AGUA	LT	54.00	198.00	1.00	198.00	10,692.00	3.37 %
	Material	MA03	ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	56,537.00	0.63	1.00	0.63	35,618.31	11.22 %
	Material	MA04	CEMENTO GRIS	KG	642.00	260.00	1.00	260.00	166,920.00	52.60 %
	Material	MA05	TRITURADO EN MUNICIPIO	M3	53,845.00	0.84	1.00	0.84	45,229.80	14.25 %
	Mano de Obra	MO01	AYUDANTE	JORNAL	115,000.00	2.00	4.70	0.43	48,936.17	15.42 %



Navegación


- Base de Datos
 - Listados
 - Tutorial
 - Gobernación del...
 - Listado 1
 - Presupuestos
 - Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Presupuesto 9 [Itemizado] Presupuesto 9 [Recursos]

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1	M3	100.00	1.00	158,662.02	15,866,201.51



Análisis: 01 | TAREA 1

Info	Tipo de Recurso	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad	Factor	Cantidad Total	Importe	% Incidencia
	Tarea	01	TAREA 1	M3	158,662.02	100.00	1.00	100.00	15,866,201.51	100.00 %
	Material	MA01	CONCRETO 2000 PSI	M3	317,324.03	0.50	1.00	0.50	158,662.02	100.00 %

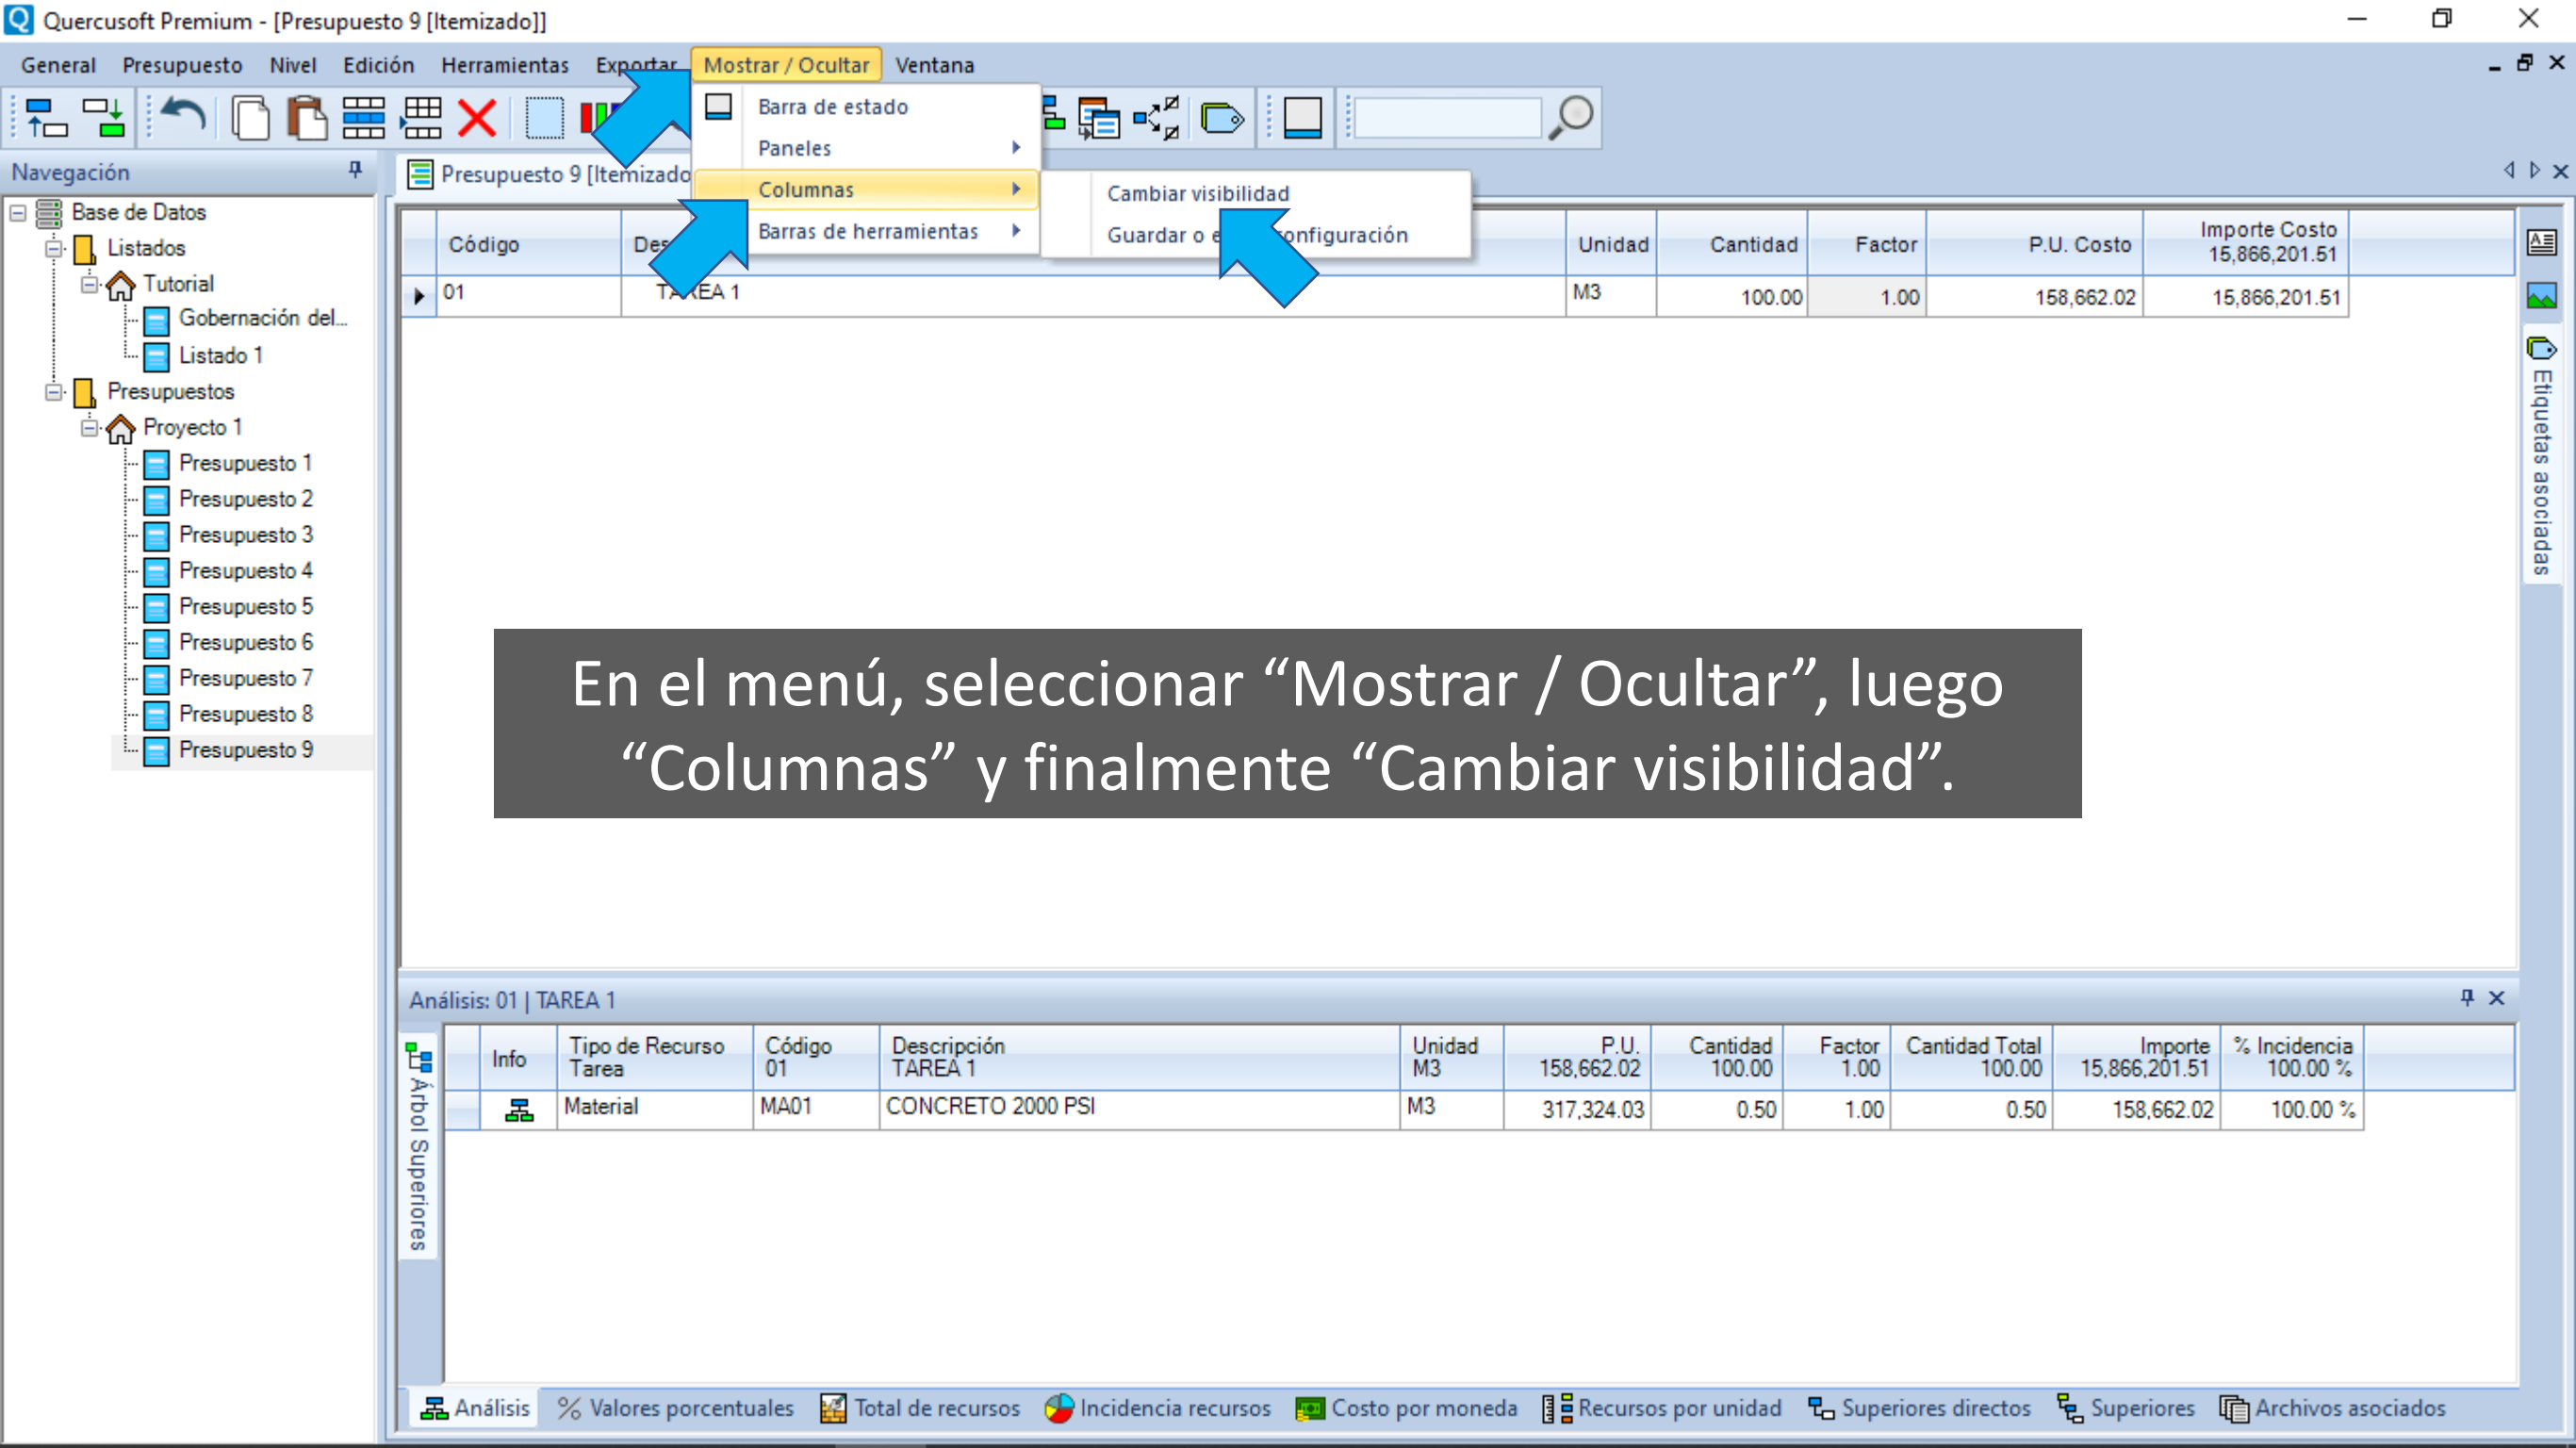

En el menú, seleccionar “Mostrar / Ocultar”, luego “Columnas” y finalmente “Cambiar visibilidad”.



Etiquetas asociadas



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1			1.00	158,662.02	15,866,201.51

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1			1.00	158,662.02	15,866,201.51

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1			1.00	158,662.02	15,866,201.51

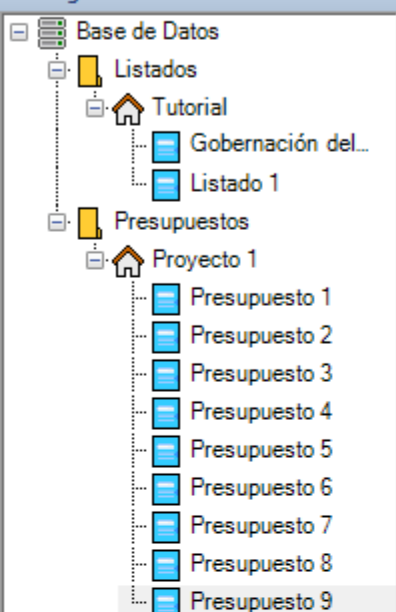

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1			1.00	158,662.02	15,866,201.51

Columnas visibles



Columna	Visible
General	☐
% Incidencia	☒
Bloquear totalización	☒
Cantidad	☒
Cantidad Total	☒
Código	☒
Código 2	☐
Descripción	☒
Descripción 2	☐
Factor	☒
Factor 2	☐
Fecha precio	☐
Importe	☒
Info	☒
Moneda	☐
P.U.	☒
P.U. Moneda Base	☐
Tipo de Recurso	☒
Unidad	☒
Valores porcentuales específicos	☐

Aceptar Cancelar

Presionar el botón "Aceptar".

Info	Tipo de Recurso
	Tarea
	Material

Factor	Cantidad Total	Importe	% Incidencia
1.00	100.00	15,866,201.51	100.00 %
1.00	0.50	158,662.02	100.00 %



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1	M3	100.00	1.00	158,662.02	15,866,201.51

Se muestra la columna.

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código 01	Bloquear totalización	Descripción TAREA 1	Unidad M3	P.U. 158,662.02	Cantidad 100.00	Factor 1.00	Cantidad Total 100.00	Importe 15,866,201.51	% Incidencia 100.00 %
	Material	MA01	☒	CONCRETO 2000 PSI	M3	317,324.03	0.50	1.00	0.50	158,662.02	100.00 %



Presupuesto 9 [Itemizado] Presupuesto 9 [Recursos]

[illegible]

Etiquetas asociadas

Marcar el campo “Bloquear totalización” de “CONCRETO 2000 PSI”.

Árbol Superiores



Presupuesto 9 [Itemizado] Presupuesto 9 [Recursos]





Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
01	TAREA 1	M3	100.00	1.00	158,662.02	15,866,201.51

Cambiar a la vista “Recursos” seleccionando la solapa correspondiente.

✕

Árbol Superiores





Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 15,866,201.51	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					2,446,808.51		15.42 %
MO01	AYUDANTE	JORNAL	115,000.00	21.28	2,446,808.51	100.00 %	15.42 %
Equipos					496,387.50		3.13 %
EQ01	MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	79,422.00	6.25	496,387.50	100.00 %	3.13 %
Materiales					12,923,005.50		81.45 %
MA02	AGUA	LT	54.00	9,900.00	534,600.00	4.14 %	3.37 %
MA03	ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	56,537.00	31.50	1,780,915.50	13.78 %	11.22 %
MA04	CEMENTO GRIS	KG	642.00	13,000.00	8,346,000.00	64.58 %	52.60 %
MA05	TRITURADO EN MUNICIPIO	M3	53,845.00	42.00	2,261,490.00	17.50 %	14.25 %

Superiores directos

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
--------	-------------	--------	----------	--------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------

Se siguen mostrando los componentes de
"CONCRETO 2000 PSI".




Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 15,866,201.51	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					2,446,808.51		15.42 %
MO01	AYUDANTE	JORNAL	115,000.00	21.28	2,446,808.51	100.00 %	15.42 %
Equipos					496,387.50		3.13 %
EQ01	MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	79,422.00	6.25	496,387.50	100.00 %	3.13 %
Materiales					12,525,005.50		81.45 %
MA02	AGUA	LT	54.00	9,900.00	534,600.00	4.14 %	3.37 %
MA03	DEBILITACION DE CIMENTACION	M	21,651.00	3.00	469,653.00	13.78 %	11.22 %
MA04	CEMENTO GRIS	KG	642.00	13,000.00	8,346,000.00	64.58 %	52.60 %
MA05	CEMENTO PORTLAND	KG	3,000.00	13,000.00	3,900,000.00	17.50 %	14.25 %

Para que el programa tome en cuenta el campo “Bloquear totalización” al momento de totalizar, debemos activar la opción “Aplicar bloqueo de totalización” en la vista “Tablero”.

Esto nos permite alternar entre un modo de totalización y el otro sin tener que marcar o desmarcar cada concepto individualmente.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
--------	-------------	--------	----------	--------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------



- Tablero
- Itemizado
- Recursos
- Explorador
- Plan de trabajo
- Informes
- Exportar presupuesto
- Exportar FIEBDC


- Presupuesto 1
- Presupuesto 2
- Presupuesto 3
- Presupuesto 4
- Presupuesto 5
- Presupuesto 6
- Presupuesto 7
- Presupuesto 8
- Presupuesto 9

Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 15,866,201.51	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra							
MO01	AYUDANTE	JORNAL	115,000.00	21.28	2,446,808.51	100.00 %	15.42 %
Equipos							
EQ01	MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	79,422.00	6.25	496,387.50	100.00 %	3.13 %
Materiales							
MA02	AGUA	LT	54.00	9,900.00	534,600.00	4.14 %	3.37 %
MA03	ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	56,537.00	31.50	1,780,915.50	13.78 %	11.22 %
MA04	CEMENTO GRIS	KG	642.00	13,000.00	8,346,000.00	64.58 %	52.60 %
MA05	TRITURADO EN MUNICIPIO	M3	53,845.00	42.00	2,261,490.00	17.50 %	14.25 %

Abrir la vista “Tablero” seleccionando en el menú “Presupuesto” y luego “Tablero”.

Superiores directos

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
--------	-------------	--------	----------	--------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------



Base de Datos


- Listados
 - Tutorial
 - Gobernación del...
 - Listado 1
- Presupuestos
 - Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Propiedad	Valor
Nombre	Presupuesto 9
Descripción	
Tipo presupuesto	Estudio
Superficie	
Presupuesto Base	
Costo	15,866,201.51
Costo directo	
Venta	
Diferencia venta - costo	-15,866,201.51

Base	Moneda	Tasa Cambio	Importe
☒	PESO	1.00	15,866,201.51

Dato	Cantidad
Ítems Principales sin análisis	0
Ítems Principales	1
Ítems Auxiliares	1
Ítems Principales/Auxiliares	0
Recursos	6
Cantidad de Rubros	0
Total Conceptos	8
Total Relaciones	8

Observaciones

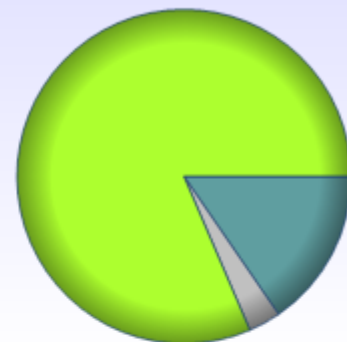

	Tipo	Importe	Incidencia
	Mano de Obra	2,446,808.51	15.42 %
	Equipos	496,387.50	3.13 %
	Materiales	12,923,005.50	81.45 %
	Subcontratos		
	Otros		
	Tareas s/ análisis		
	Total	15,866,201.51	

Nombre	Código	Descripción	Tipo	Tipo de Recurso	Por defecto	Valor por defecto	Importe sin bloqueo	Importe con bloqueo

Navegación


- Base de Datos
- Listados
 - Tutorial
 - Gobernación del...
 - Listado 1
- Presupuestos
 - Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Opciones

- Presupuesto o listado base
- Configuración de costo total
- Campos personalizados
- Unidades de mano de obra
- Aplicar bloqueo de totalización

Valor	
Presupuesto 9	
Descripción	
Tipo de costo	Estudio
Superficie	
Presupuesto Base	
Costo	15,866,201.51
Costo directo	
Venta	
Diferencia venta - costo	-15,866,201.51

Conceptos por nivel	
Dato	Cantidad
Ítems Principales sin análisis	0
Ítems Principales	1
Ítems Auxiliares	1
Ítems Principales/Auxiliares	0
Recursos	6
Cantidad de Rubros	0
Total Conceptos	8
Total Relaciones	8

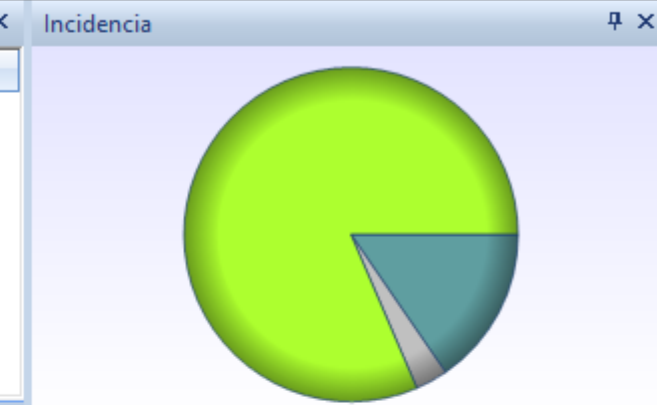

Monedas	
Base	
☒ PESO	1.00 15,866,201.51

Tipo	Importe	Incidencia
Mano de Obra	2,446,808.51	15.42 %
Equipos	496,387.50	3.13 %
Materiales	12,923,005.50	81.45 %
Subcontratos		
Otros		
Tareas s/ análisis		
Total	15,866,201.51	

Valores porcentuales								
Nombre	Código	Descripción	Tipo	Tipo de Recurso	Por defecto	Valor por defecto	Importe sin bloqueo	Importe con bloqueo

En el menú, seleccionar “Opciones” y luego “Aplicar bloqueo de totalización”.

Navegación

Base de Datos
Listados
Tutorial
Gobernación del...
Listado 1
Presupuestos
Proyecto 1
Presupuesto 1
Presupuesto 2
Presupuesto 3
Presupuesto 4
Presupuesto 5
Presupuesto 6
Presupuesto 7
Presupuesto 8
Presupuesto 9

- Presupuesto o listado base
- Configuración de costo total
- Campos personalizados
- Unidades de mano de obra
- ☒ Aplicar bloqueo de totalización

es de mano de obra	Valor
bloqueo de totalización	Presupuesto 9
Descripción	
Tipo de costo	Estudio
Superficie	
Presupuesto Base	
Costo	15,866,201.51
Costo directo	
Venta	
Diferencia venta - costo	-15,866,201.51

Conceptos por nivel	
Dato	Cantidad
Ítems Principales sin análisis	0
Ítems Principales	1
Ítems Auxiliares	1
Ítems Principales/Auxiliares	0
Recursos	6
Cantidad de Rubros	0
Total Conceptos	8
Total Relaciones	8

Monedas			
Base	Moneda	Tasa Cambio	Importe
☒	PESO	1.00	15,866,201.51


Observaciones	




	Tipo	Importe	Incidencia
	Mano de Obra		
	Equipos		
	Materiales	15,866,201.51	100.00 %
	Subcontratos		
	Otros		
	Tareas s/ análisis		
	Total	15,866,201.51	

Valores porcentuales								
Nombre	Código	Descripción	Tipo	Tipo de Recurso	Por defecto	Valor por defecto	Importe sin bloqueo	Importe con bloqueo

Se muestra la opción activada.




Navegación

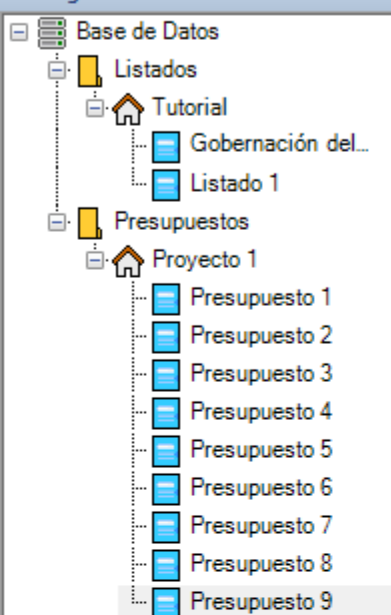

Presupuesto 9 [Itemizado] Presupuesto 9 [Recursos] Presupuesto 9 [Tablero]

Propiedad	Valor
Nombre	Presupuesto 9
Descripción	
Tipo presupuesto	Estudio
Superficie	
Presupuesto Base	
Costo	15,866,201.51
Costo directo	
Venta	
Diferencia venta - costo	-15,866,201.51

Conceptos por nivel	
Dato	Cantidad
Ítems Principales sin análisis	0
Ítems Principales	1
Ítems Auxiliares	1
Ítems Principales/Auxiliares	0
Recursos	6
Cantidad de Rubros	0
Total Conceptos	8
Total Relaciones	8

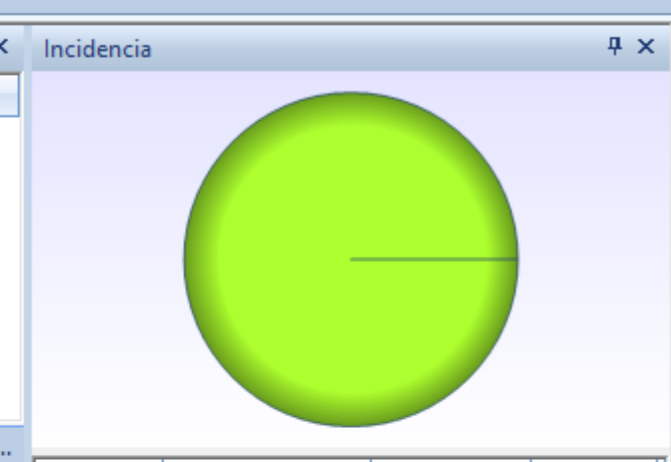

Monedas	Base	Porcentaje	Importe
☒	PESO	1.00	15,866,201.51

Tipo	Importe	Incidencia
Mano de Obra		
Equipos		
Materiales	15,866,201.51	100.00 %
Subcontratos		
Otros		
Tareas s/ análisis		
Total	15,866,201.51	

Valores vacíos Monedas Observaciones Archivos asociados Incidencia Valor por m2 Imagen

Valores porcentuales								
Nombre	Código	Descripción	Tipo	Tipo de Recurso	Por defecto	Valor por defecto	Importe sin bloqueo	Importe con bloqueo

Recursos mayor incidencia Conceptos primer nivel Costo total % Valores porcentuales

Cambiar a la vista "Recursos" seleccionando la solapa correspondiente.



Et

4 X

C
